

Nové programové obdobie z pohľadu informačnej spoločnosti

13.11.2013

Počas realizácie projektov OP IS sa vyskytli určité problémy, z ktorých sa možno poučiť pre nasledujúce obdobie rozvoja informatizácie na Slovensku.

Poučenia z OPIS PO1

Problém

1 Nedostatočná príprava legislatívy a príslušných štandardov.

2 Koordinácia projektov a závislostí.

3 Schopnosť jednotlivých povinných osôb realizovať projekty.

- Priemerný počet dodatkov týkajúcich sa úpravy harmonogramu: **2 / projekt**
- Priemerná dĺžka trvania verejného obstarávania: **14 M**
- Priemerná dĺžka od uzavretia zmluvy o NFP po uzavretie zmluvy s dodávateľom: **10 M**
- Priemerná dĺžka implementácie projektov: plánovaná: **28,5 M**, reálna: **49 M**

Stratégia k zníženiu rizika

- Kapacita štandardizačného orgánu musí byť posilnená (inovačné centrum eGovernmentu).
- Potreba vytvoriť centralizovanú programovú kanceláriu a enterprise architektúru eGovernmentu.
- Je nutné vyvíjať tlak na neustále zlepšovanie IT oddelení inštitúcií a zvyšovanie ich odbornej spôsobilosti (z hľadiska kvality a kvantity).
- Posilniť výmenu skúseností medzi inštitúciami najmä v oblasti kvality projektového riadenia.
- Posilniť centrálnu kontrolu, najmä v oblasti analýz, architektúry a technologického riešenia.
- Zvýšiť otvorenosť voči technologickým inováciám.

Počas realizácie projektov OP IS sa vyskytli určité problémy, z ktorých sa možno poučiť pre nasledujúce obdobie rozvoja informatizácie na Slovensku.

Poučenia z OPIS PO1

Problém


3 Schopnosť jednotlivých povinných osôb realizovať projekty.

- Priemerný počet dodatkov týkajúcich sa úpravy harmonogramu: **2 / projekt**
- Priemerná dĺžka trvania verejného obstarávania: **14 M**
- Priemerná dĺžka od uzavretia zmluvy o NFP po uzavretie zmluvy s dodávateľom: **10 M**
- Priemerná dĺžka implementácie projektov: plánovaná: **28,5 M**, reálna: **49 M**

Stratégia k zníženiu rizika

- Zavedenia KPI
- Štandardizácia
 - Štúdie uskutočniteľnosti (formulárová forma)
 - Nákladové analýzy (CBA, TCO)
 - Integrácie
- eCohesion (elektronická výmena informácií, týkajúcich sa EU fondov)
- Centralizácia nákupov
 - Hardware (MV SR)
 - SW licencie (MF SR)
 - Podporné aktivity (napr. publicita (RO/SORO))

Primerný čas realizácie základných krokov projektového riadenia v rámci OP IS (od výzvy po prvé čerpanie)

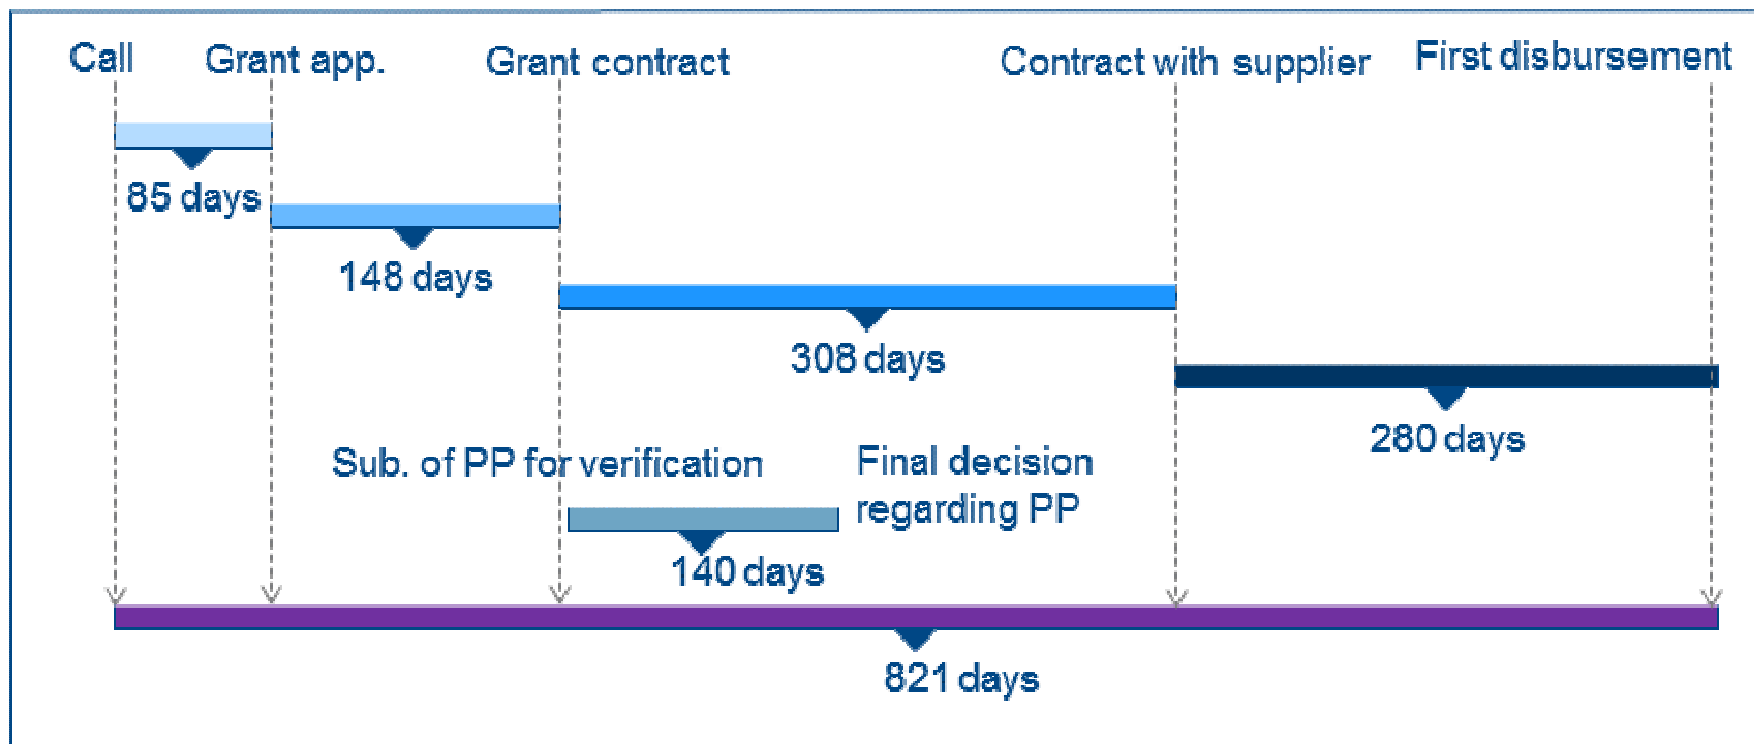

Hlavnými faktormi zlyhania prioritnej osi 3 sú: v počiatočnej fáze nedostatočné kapacity realizovať projekty daného rozsahu a ťažkosti s procesom prípravy.

Príčiny zlyhania OPIS PO 3

Problém

1

Proces prípravy sa ukázal náročnejší ako bolo očakávané.


2

Z dôvodu zmeny zamerania spočiatku na strane realizátora neexistovali dostatočné kapacity.


Stratégia k zníženiu rizika

- Existujú presné príručky Európskej komisie ako postupovať
 - Administratívne postupy už boli spracované a sú pripravené :
 - Metodika pre identifikáciu bielych miest
 - Dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci
 - Štúdiá uskutočniteľnosti a jasné všeobecne prijaté ciele
 - Koordinácia plánovania s operátormi
 - Prebieha obstarávanie
-
- V roku 2009 bola vytvorená agentúra NASES so zodpovednosťou za realizáciu národných investícií do širokopásmového pripojenia v regionálnych sieťach.
 - Potreba najat' primerané technické a administratívne kapacity s dostatkom skúseností.


Strategický dokument definuje národné priority, pričom napĺňa ciele z pozičného dokumentu komisie a realizuje opatrenia Digitálnej Agendy pre Európu

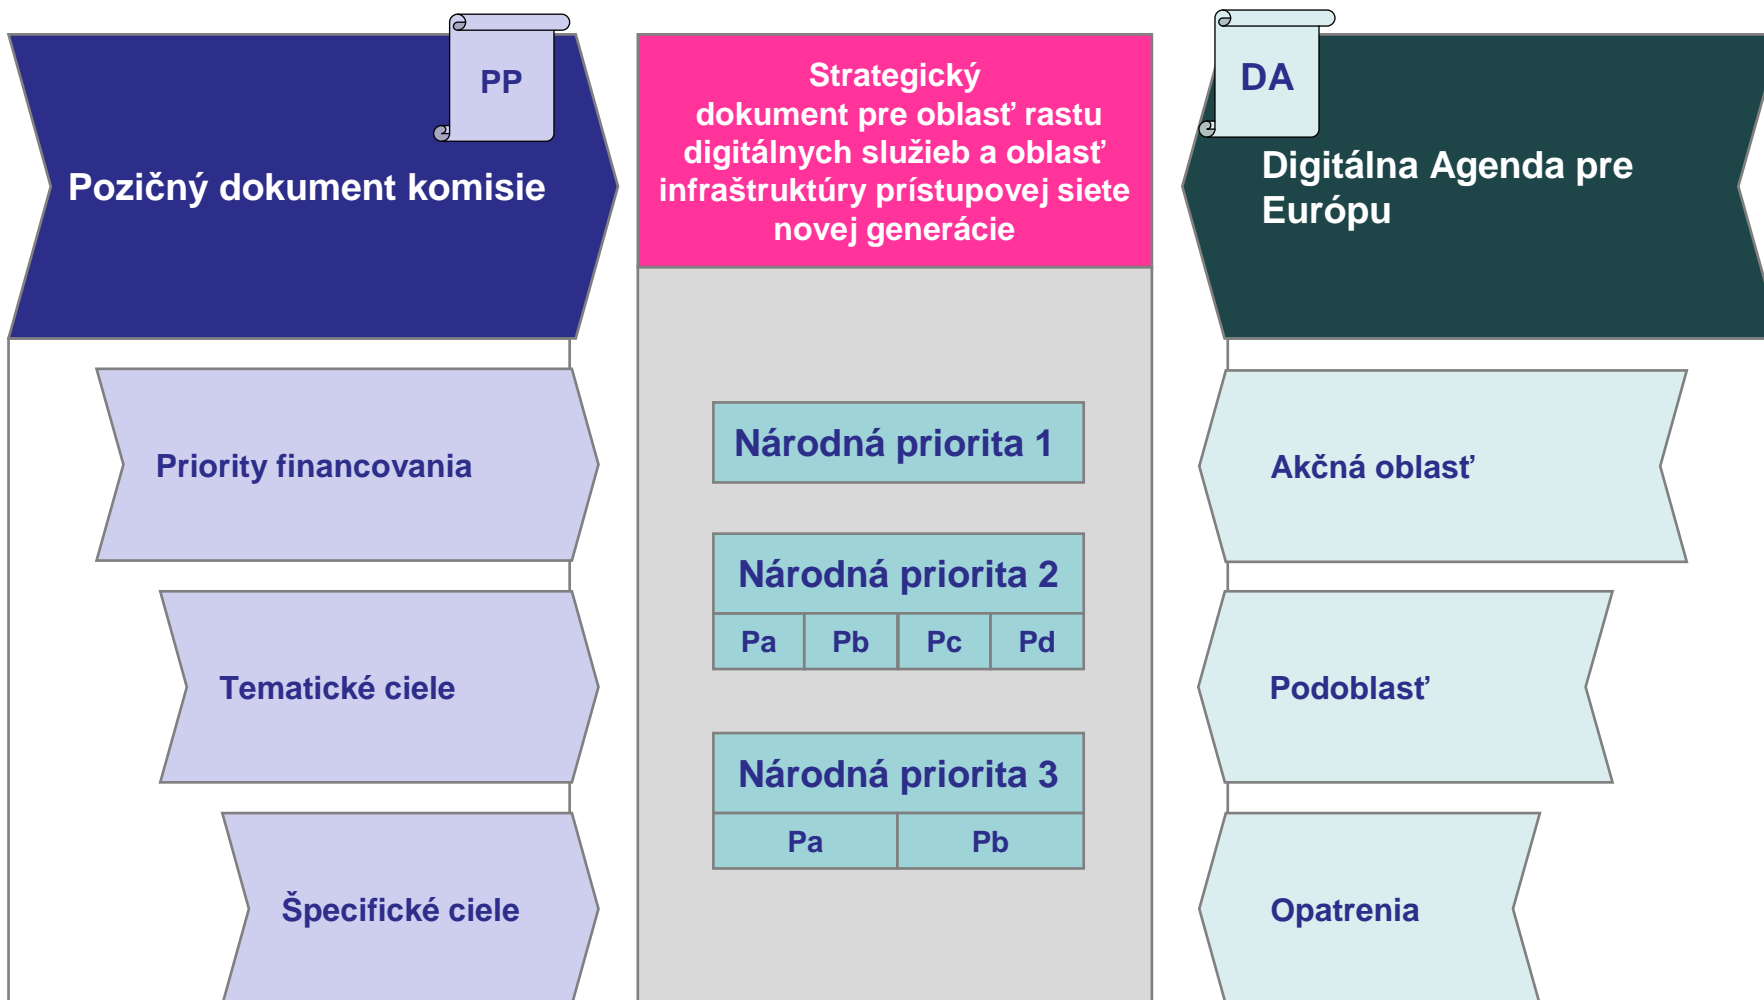


Investičné priority a ich špecifické ciele uvedené v Strategickom dokumente sú výsledkom našej vízie - širokopásmové pripojenie ako predpoklad pre inovatívne služby a efektívnu vládu.

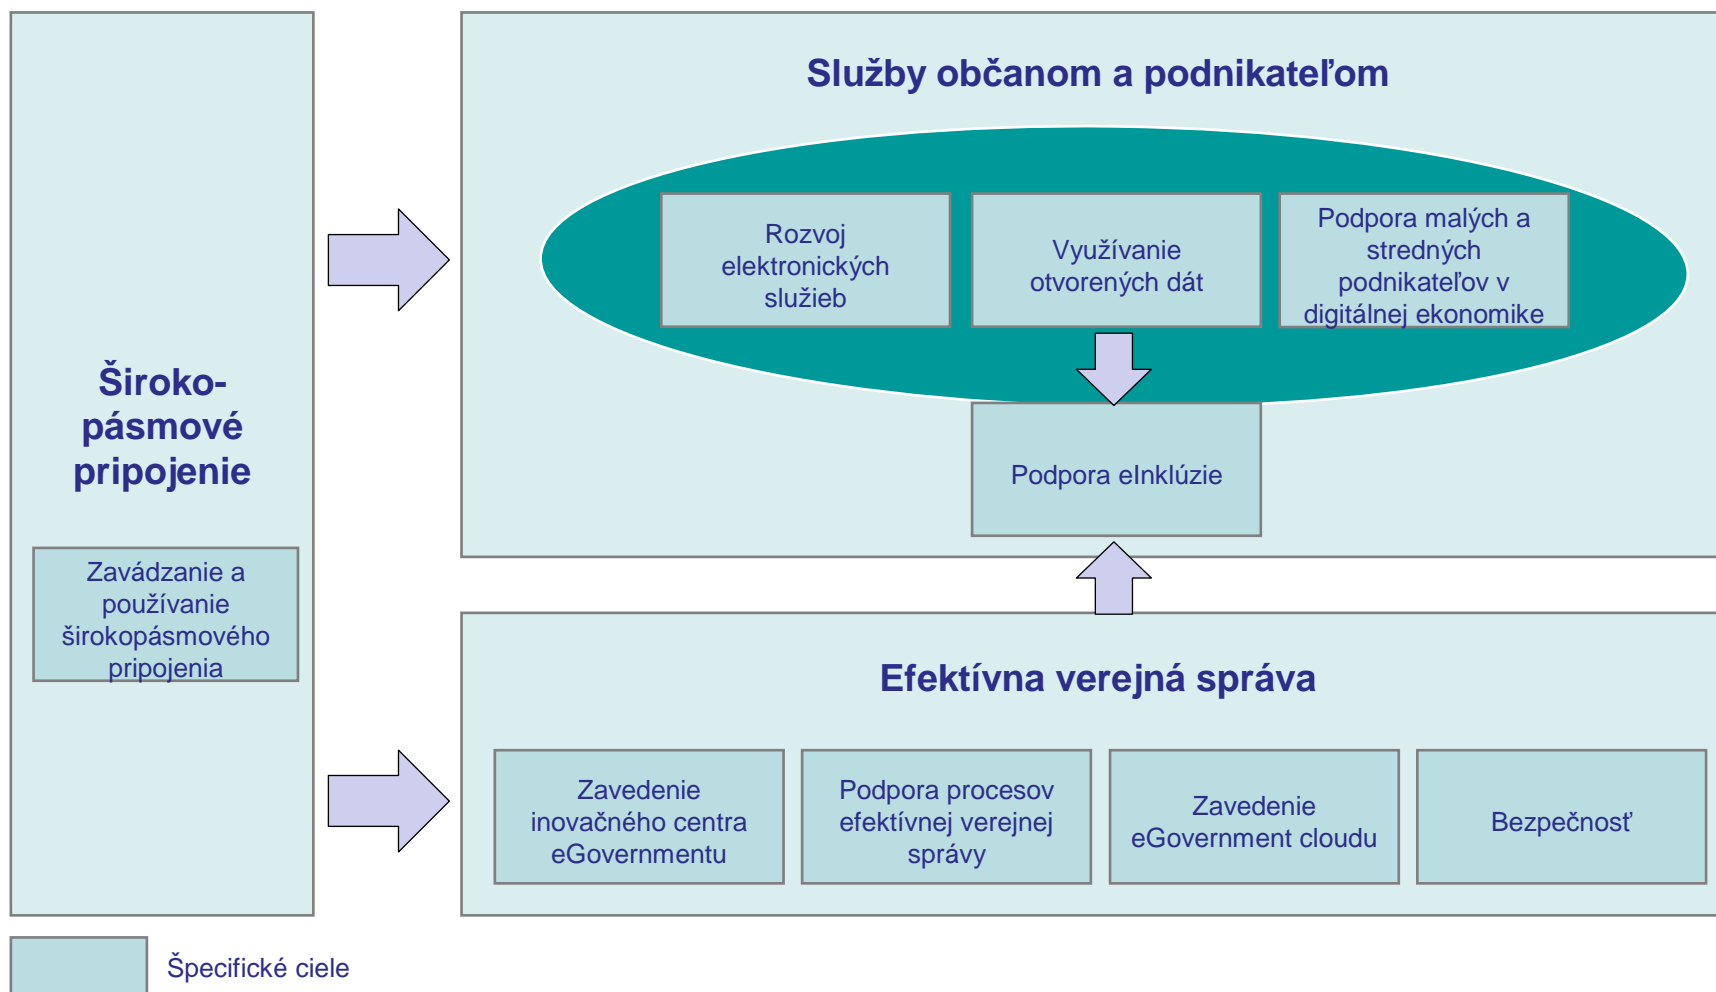


OPIS umožnil príchod novej generácie eGovernmentu, ktorý bude ďalej rozvíjaný v OP II

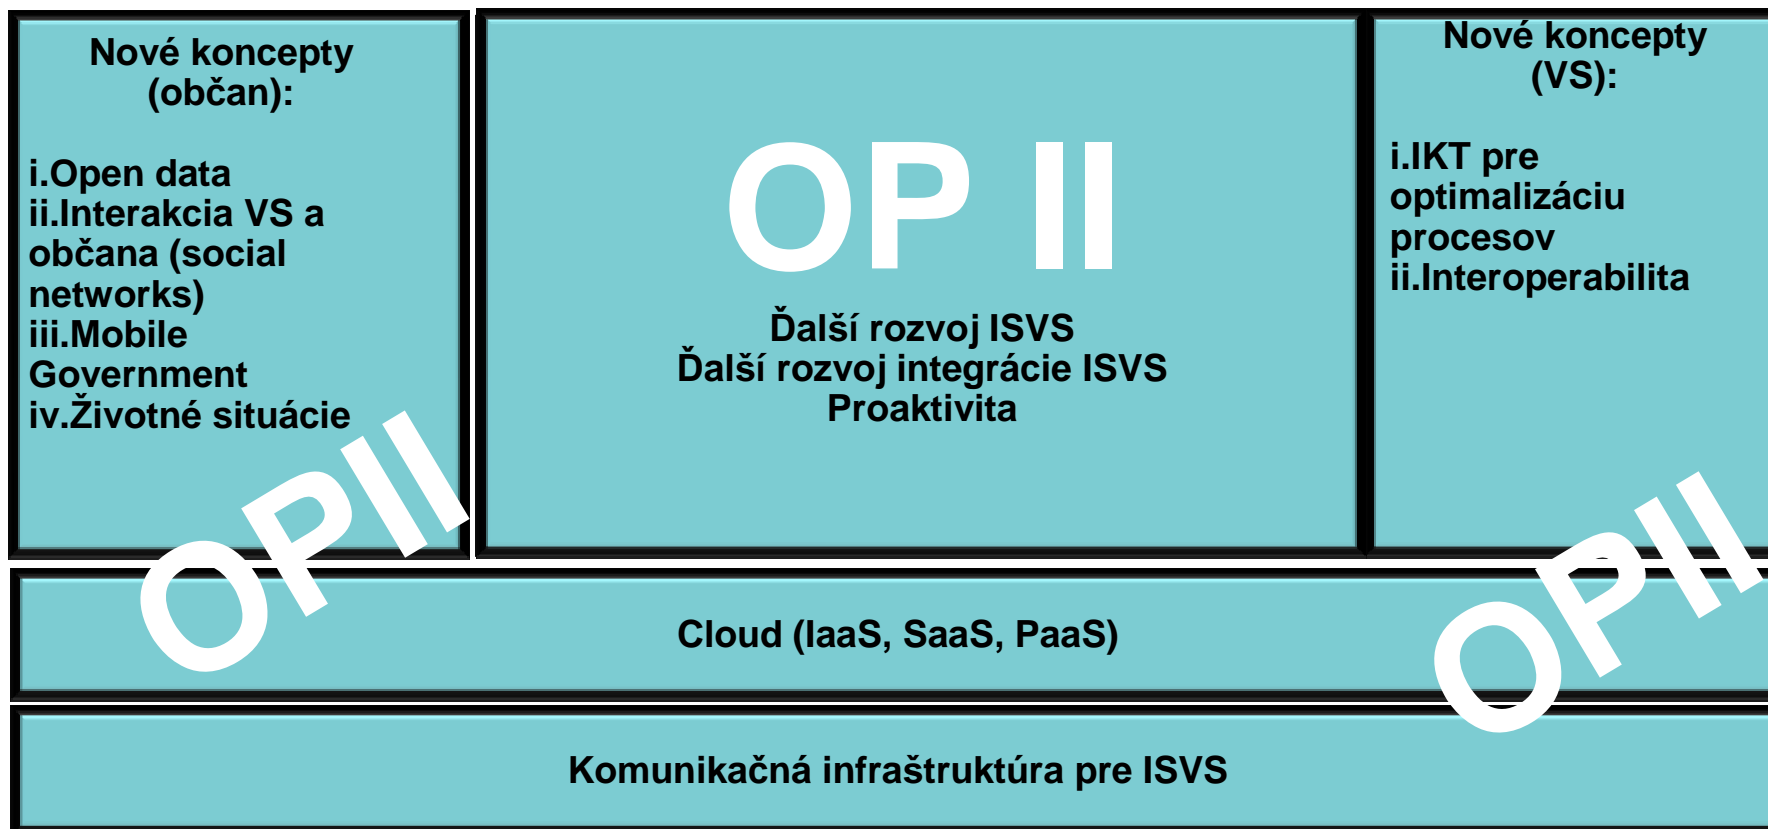


Po dokončení spoločných prístupových komponentov a základných registrov je možné očakávať príchod tretej generácie eGovernmentu.

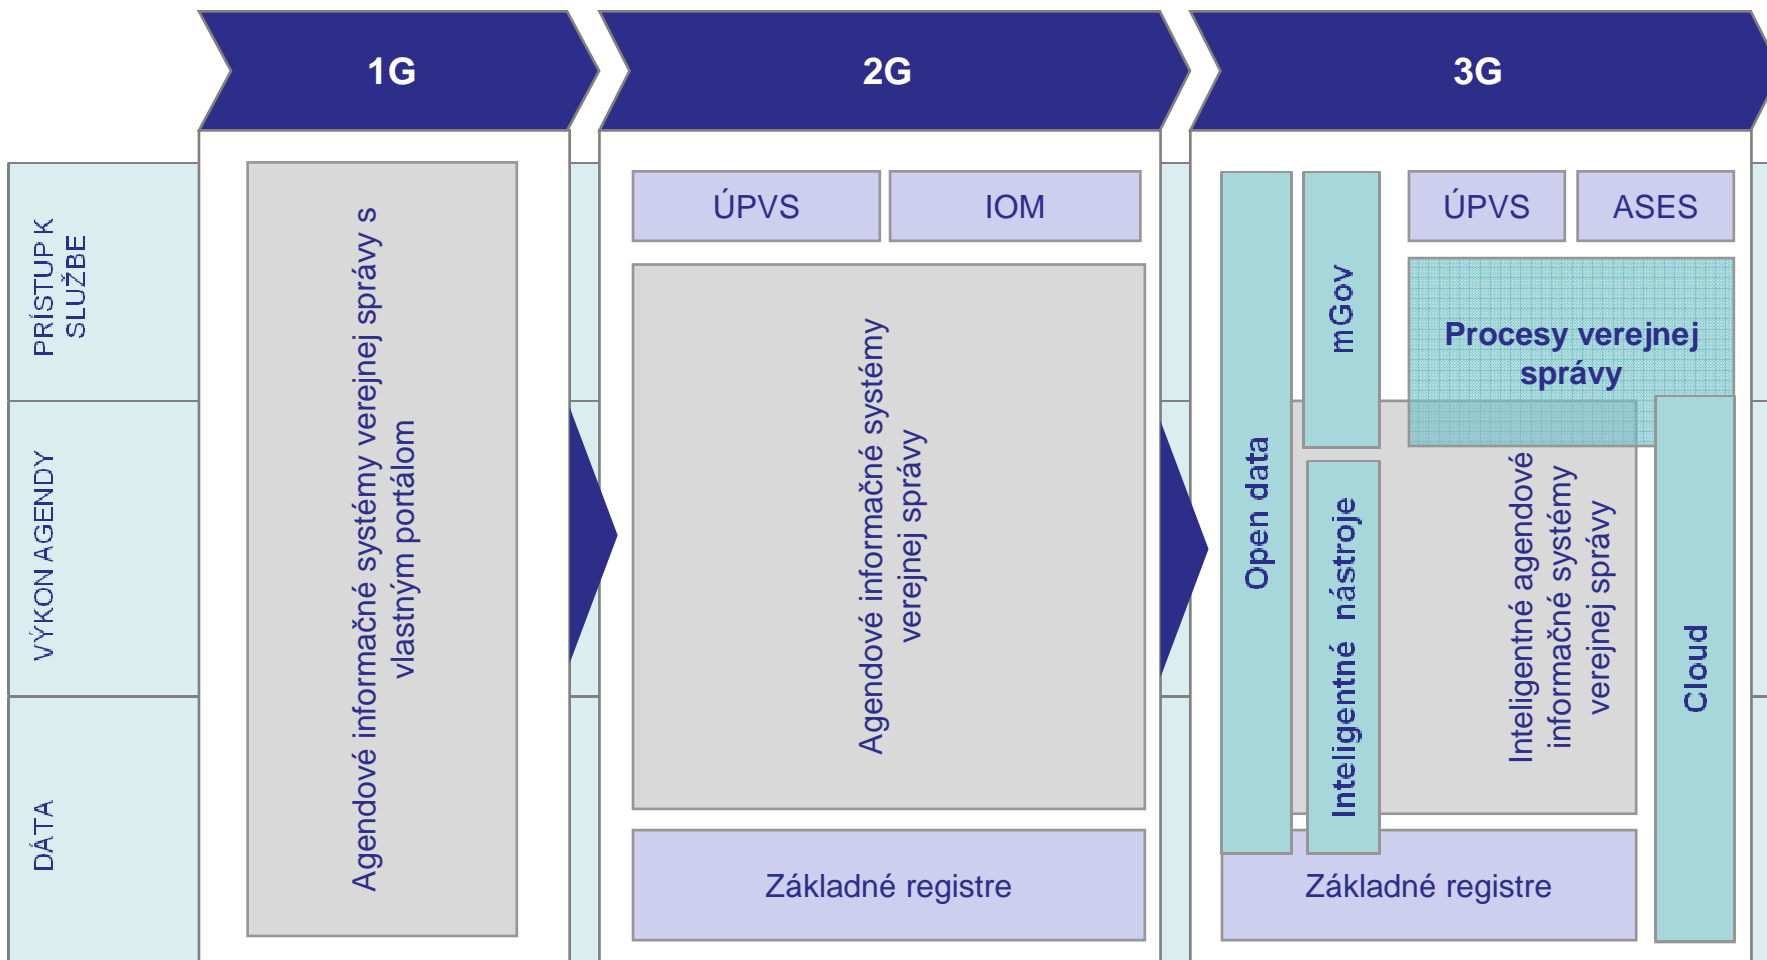

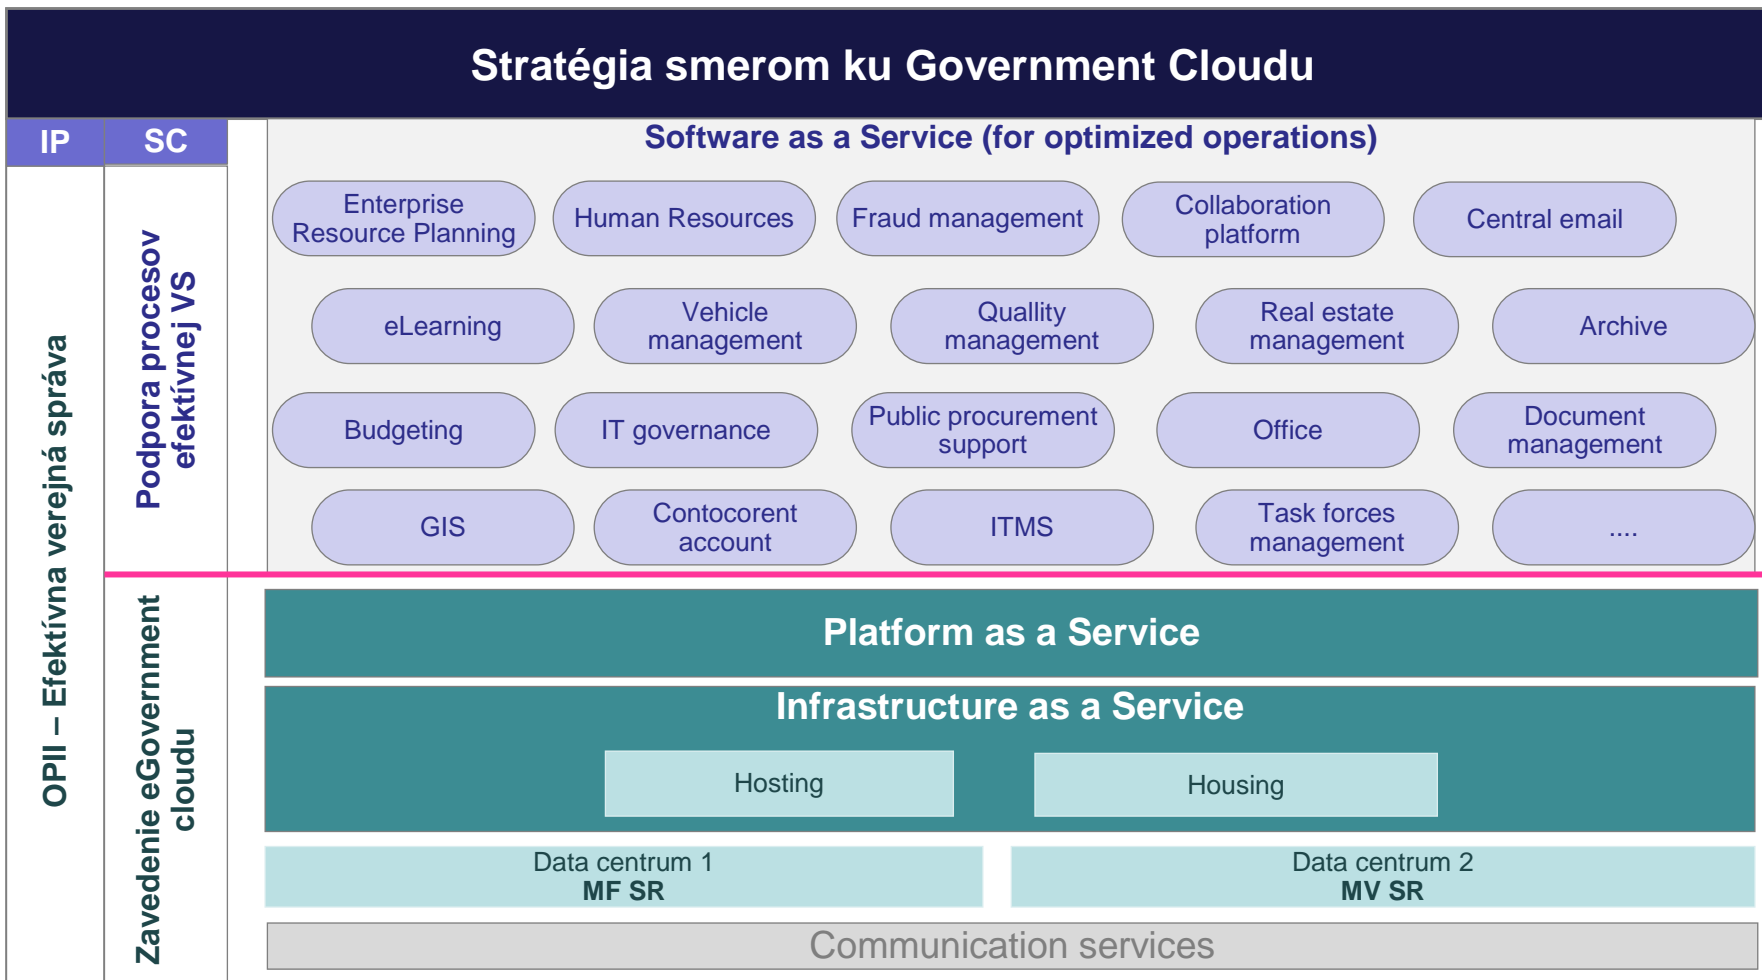

Operačný programu Integrovaná infraštruktúra v rámci prioritnej osi 7 Informatizácia spoločnosti. Navrhnuté investičné priority a špecifické ciele sú založené na odporúčaní, ktoré boli odvodené z dôkladných analýz a odporúčaní EÚ.

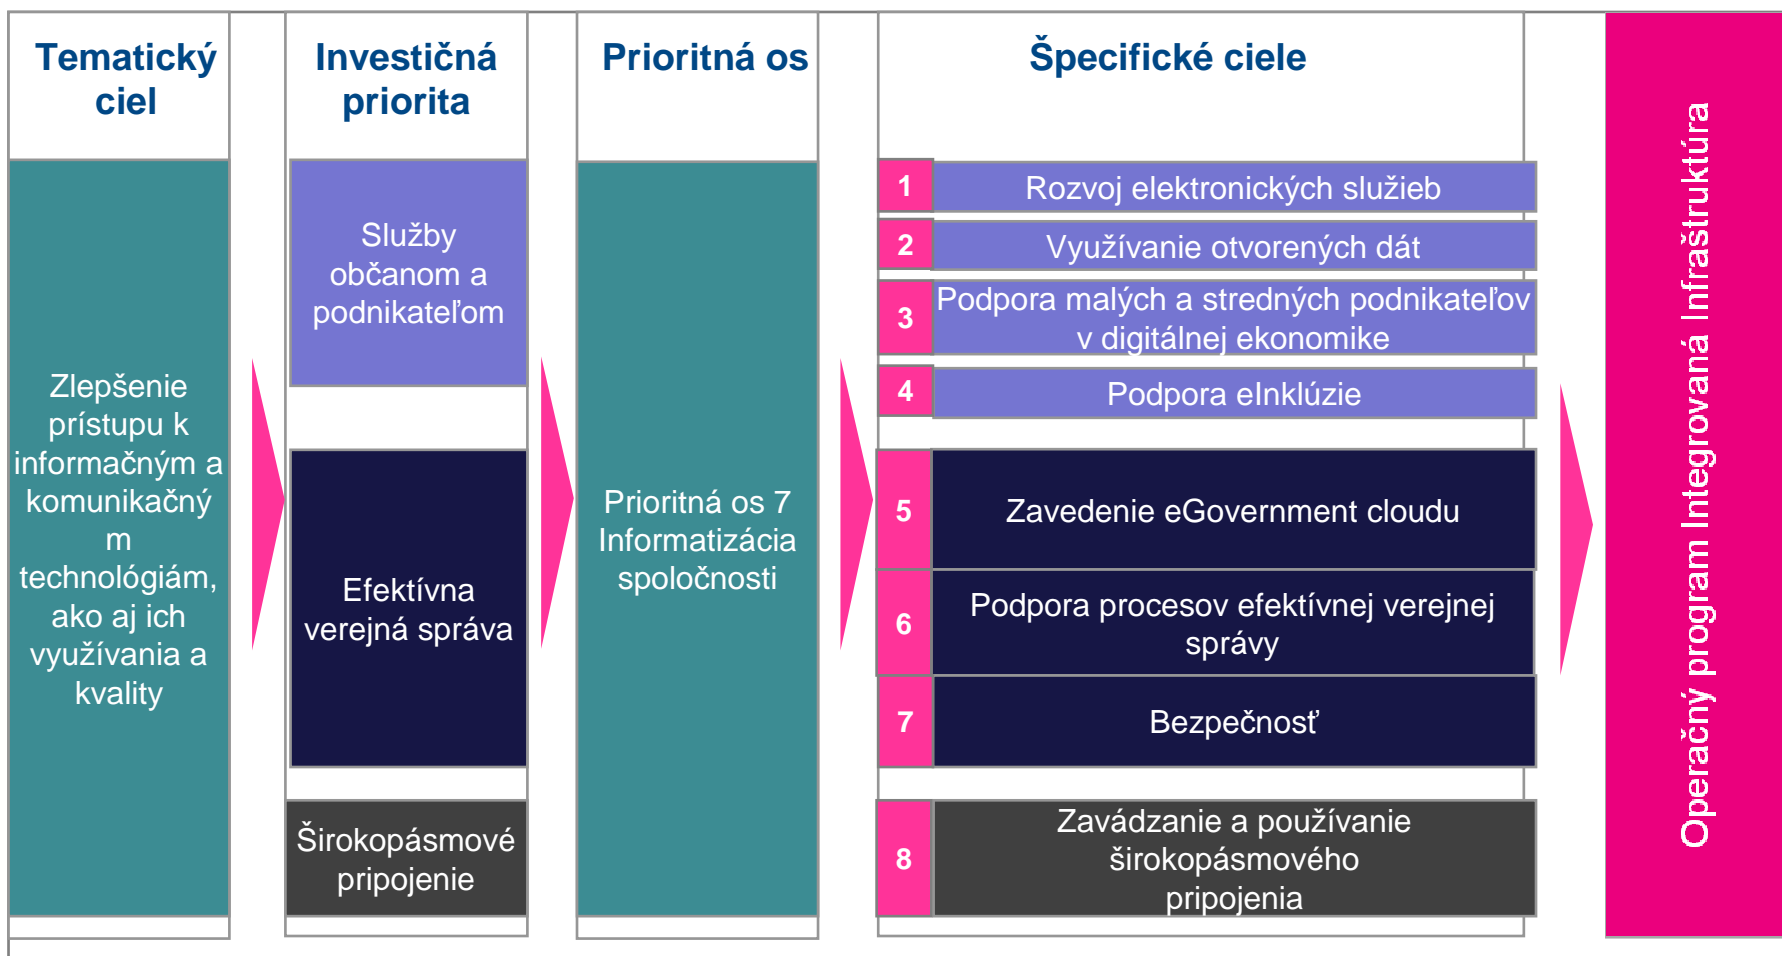

Prehľad štruktúry Prioritnej osi 7 OP Integrovaná infraštruktúra a návrh rozpočtu





TVORÍME VEDOMOSTNÚ
SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Ďakujem za pozornosť

www.informatizacia.sk

OPIS je spolufinancovaný z EFRR

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

