

Implementácia OPIS

Výzvy obstarávateľov a dodávateľov

Pavel Bojňanský
Bratislava, 29.05.2013

Úlohy MF SR pri riadení informatizácie spoločnosti

Sú definované Zákonom č.275/2006 Z.z. MF SR definuje stratégiu informatizácie spoločnosti a priamo definuje a riadi implementáciu stratégie informatizácie verejnej správy


- Programová kancelária eGOV
 - Metodika pre projektové riadenie
 - Školenia projektových manažérov
 - SW nástroj Clarity pre riadenie projektov
 - Rizikové analýzy
 - Riadenie medzi-projektovej integrácie
 - Zjednotenie DFŠ v oblasti integrácie formulármí
 - Riadenie architektúry ISVS
- Zákon o eGovernemente
 - Legislatívny zámer schválený vládou SR dňa 29.09.2010
 - Schválený v legislatívnej rade vlády 28.05.2012
 - Predložený na rokovanie vlády SR 30.05.2012
 - Rokovanie vo výboroch NR SR v júni 2013
 - Účinnosť od 1.10.2013 (1.11.2013 podľa termínov schôdze NR SR)
- Štandardizácia
 - 10 pracovných skupín a 1 podskupina pre open source vo verejnej správe
 - Vydávanie výnosu o štandardoch ISVS (2006, 2008, 2010, 2013 (plánovaný))
- Informačná bezpečnosť
 - Stratégia a akčný plán v oblasti informačnej bezpečnosti
 - CSIRT.SK
 - Legislatívny návrh zákona o informačnej bezpečnosti
 - Štandardy a školenia
 - Zákon o informačnej bezpečnosti
- Metainformačný systém
 - Konceptie rozvoja IS povinných osôb
 - Prehľady a zoznamy eGov služieb, služieb IS
 - Číselník úsekov správy, agend a životných situácií
 - Register integrovaných obslužných miest
 - Zoznam referenčných registrov a referenčných údajov
- Implementácia OPIS PO1
 - Metodické riadenie
 - Príprava projektov, výzvy, žiadosti a zmluvy o NFP
 - Implementácia a kontrola implementácie

Aktuálne výzvy a úlohy, ktoré adresujeme pri implementácii

- Verejné obstarávanie
 - 22 projektov, ktoré majú zrealizované verejné obstarávania na hlavné aktivity obstarávali spolu 290 mesiacov
 - CISMA na MV SR 31 mesiacov, IS JIFO sa obstaráva už 51 mesiacov
- Veľké množstvo dodatkov k zmluvám o NFP
 - 65 dodatkov k 22 Zmluvám o NFP
 - 5 – MV SR (osvedčenie o evidencii vozidla)
 - 4 – ÚGKK (ESKN), MPSVaR, MV SR (RFO), MZ SR (eHealth), ÚVO SR
- Predlžovanie časových harmonogramov projektov v implementácii
 - 41 krát sa predlžoval harmonogram realizácie aktivít v Zmluvách o NFP
 - Projekty VÚC – od 46 do 62 mesiacov
 - MV SR (Matrika, RFO) – 57 mesiacov
 - ÚGKK - 53 mesiacov
- Integrácia medzi informačnými systémami rôznych povinných osôb
 - Ešte stále vytvárame „izolované ostrovy“


Harmonogramy projektov PO1 – projekty MV SR

Doteraz nie je ukončený žiaden z projektov MV SR, priemerná doba trvania projektu je viac ako 4 roky, niektoré projekty majú až 4 posuny termínov ukončenia

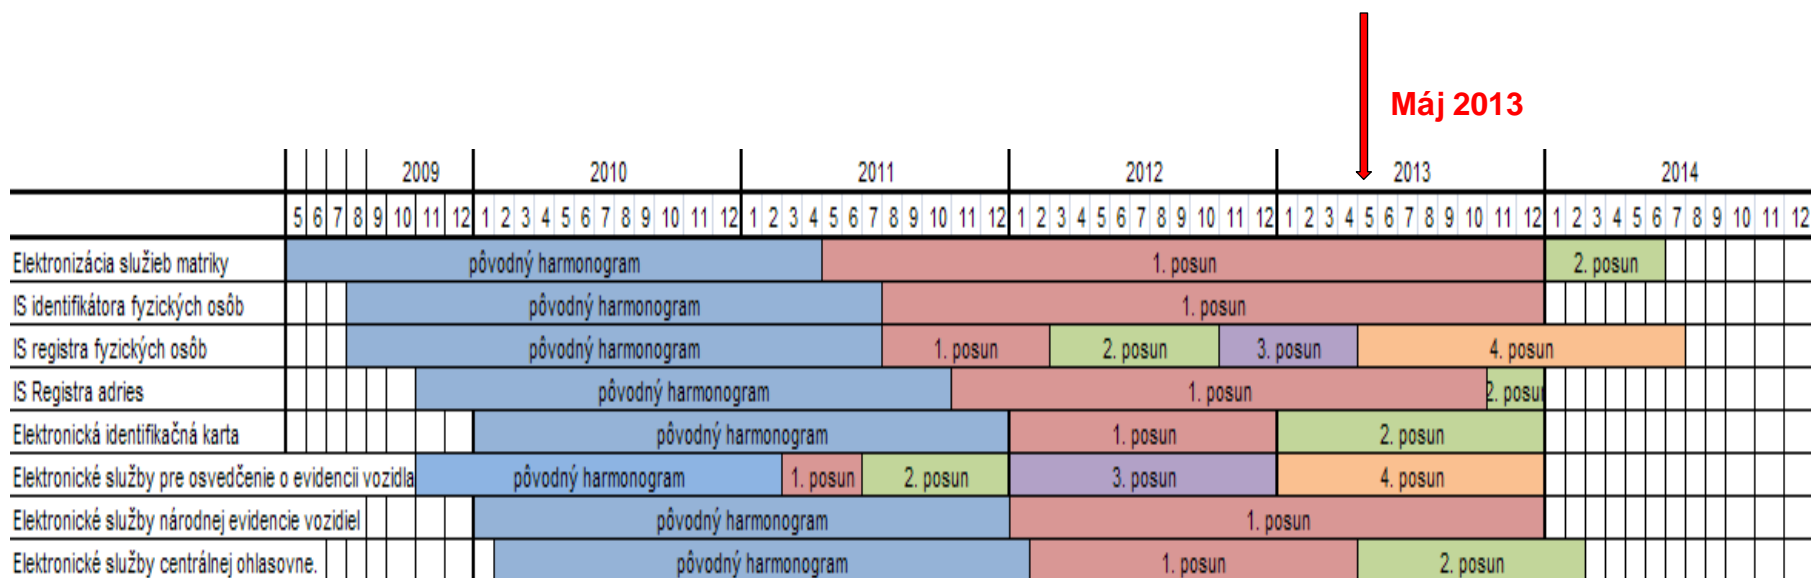

Harmonogramy projektov PO1 – národné projekty


Všetky projekty meškajú, niektoré so 4 posunmi termínov (MPSVaR), iné sa implementujú dokonca viac ako 5 rokov (ÚGKK)

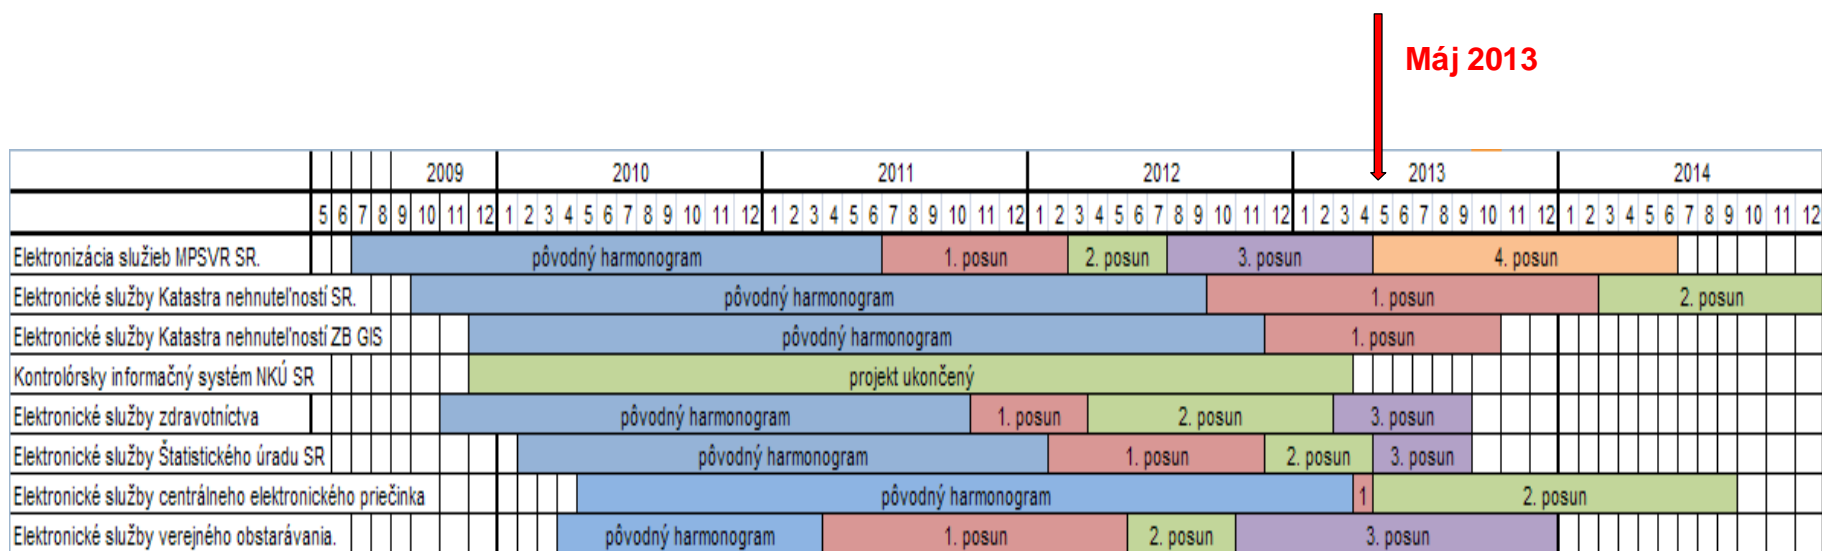


Máj 2013

Harmonogramy projektov PO1 – národné projekty


Rezorty pri implementácii nových projektov nie sú schopné začať a ukončiť verejné obstarávanie (MH SR, MS SR, GP SR, MZ SR, NR SR, SP, ÚS SR)

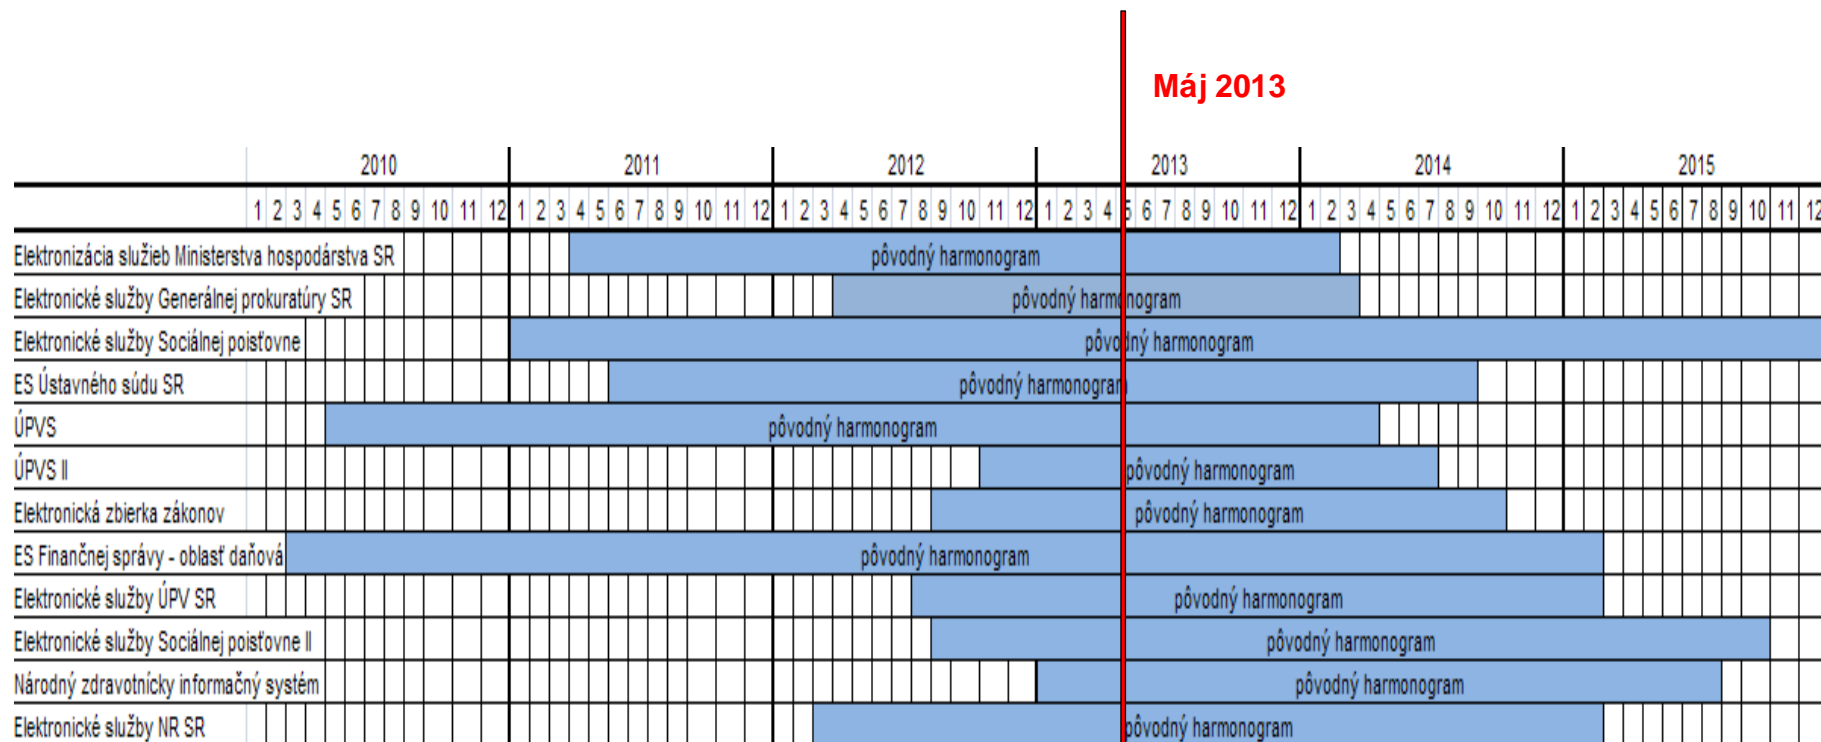

Harmonogramy projektov PO1 – samosprávne kraje

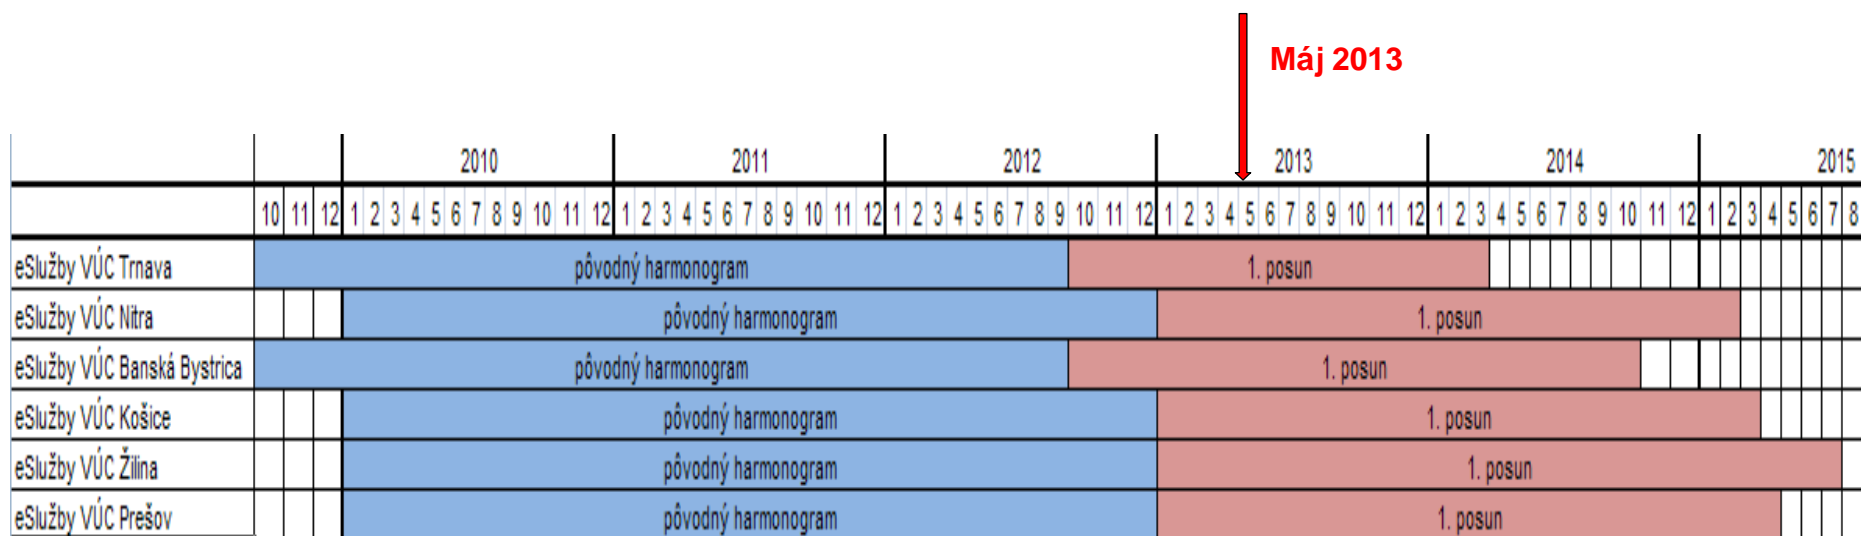

Harmonogram projektov PO1 – DCOM, IOM

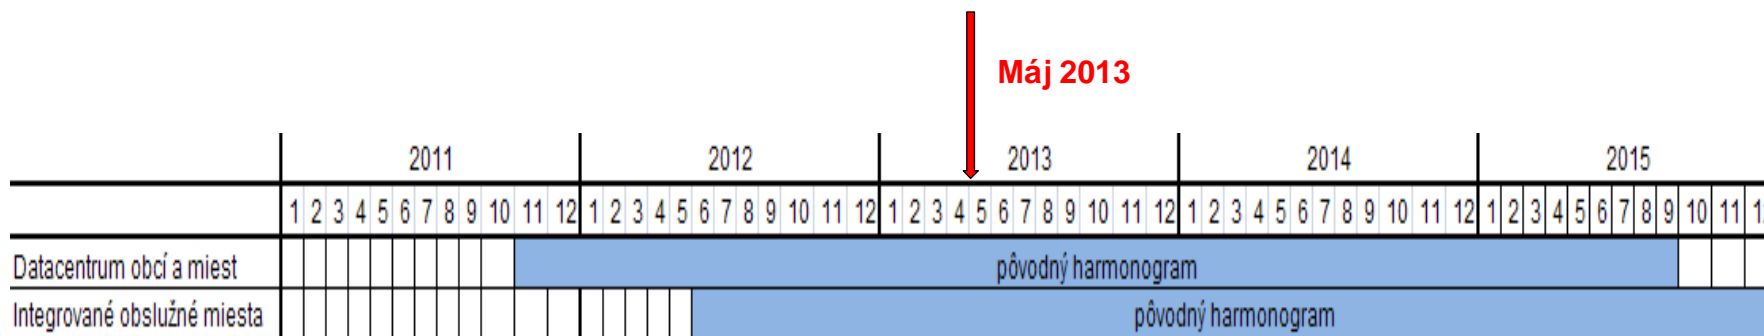

Dôvod predĺženia projektov OPIS

Názov projektu	Prijímateľ	Počet dodatkov k NFP	Počet predĺžení časového harmonogramu	Počet mesiacov od podpísania zmluvy o NFP do podpisu dodávateľskej zmluvy	Trvanie projektu od podpisu NFP po predpokladaný termín ukončenia	Počet integrovaných systémov VS	Prijatá legislatíva ANO/NIE
Elektronizácia služieb matriky	MV SR	2	2	31	57	4 (ÚPVS, RFO, IFO, RA)	NIE
Elektronizácia služieb MPSVR SR	MPSVR SR	4	3	4	41	9 (IS MPSVR SR, UPSVR SR, SP, Slov. pošta, Štátna pokladnica, UPnZS, MH SR, RFO, UPVS)	NIE
Elektronické služby katastra nehnuteľností	UGKK SR	4	1	0	53	7 (UPVS, RFO, RPO, RA, RPI, ŠU SR, CO)	NIE
IS identifikátora fyzických osôb	MV SR	1	1	N/A	50	v procese VO	NIE
IS registra fyzických osôb	MV SR	4	4	4	57	5 (CO, CISMA, IFO, RA, UPVS)	ANO
Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR	NKÚ SR	2	0	11	40	1 (UPVS)	NIE
IS Registra adries	MV SR	2	2	19	45	1 (UPVS)	NIE
Elektronické služby katastra nehnuteľností- ZB GIS	UGKK SR	5	2	1	47	1 (UPVS)	NIE
Elektronické služby zdravotníctva	MZ SR	4	3	4	46	3 (UPVS, IS PZS, ZP)	ANO
Elektronická identifikačná karta	MV SR	3	2	3	45	3 (RFO, RPO, UPVS)	ANO
Elektronické služby štatistického úradu SR	ŠÚ SR	4	4	6	37	UPVS	NIE
Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla	MV SR	5	4	0	48	4 (RFO, RPO, RA, UPVS)	ANO
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel	MV SR	3	1	16	42	3 (RFO, RPO, UPVS)	NIE
Elektronické služby centrálnej ohlasovne	MV SR	2	2	9	44	4 (RFO, RA, ESKN, UPVS)	ANO
Elektronické služby centrálného elektronického priečinka	MF SR	3	1	0	52	7 (RFO, RPO, RA, KN, COLNY IS, GPSR, UPVS,)	NIE
Elektronické služby verejného obstarávania	UVO SR	4	3	0	42	1 (UPVS)	NIE
Elektronické služby VÚC TT	VÚC TT	2	1	20	46	1 (UPVS)	NIE
Elektronizácia služieb NSK	VÚC NR	3	1	22	57	1 (UPVS)	NIE
Elektronizácia služieb VÚC – Žilina	ŽSK	2	1	30	62	1 (UPVS)	NIE
Elektronizácia služieb VÚC – Prešov	PSK	2	1	22	59	1 (UPVS)	NIE
Elektronizácia služieb VÚC – Košice	KSK	2	1	20	58	1 (UPVS)	NIE
Elektronizácia služieb VÚC - Banská Bystrica	BBSK	2	1	17	53	1 (UPVS)	NIE
Spolu		65	41				
Priemer				1.863636364	49.13636		

Diskusné témy

- **Trvanie verejného obstarávania**
 - Aké sú najväčšie brzdy procesu?
- **Personálne obsadenie na strane objednávateľa ale aj dodávateľa**
 - Koľko krát sa re-modeloval projektový tím?
 - Aký to malo vplyv na chod projektu?
 - Je vyškolený aj tím na strane objednávateľa?
 - Má tím na strane dodávateľa za sebou úspešne zrealizované projekty?
- **Dĺžka implementácie projektov**
 - Čo spôsobilo predlžovanie implementácie?
 - Je projekt ešte stále v súlade s trendmi?
 - V ktorom štádiu implementácie projektu bol dodaný HW a licencie?
- **Legislatíva**
 - Aká je korelácia medzi paragrafovým znením a DFŠ?
 - Koľko „change request-ov“ kvôli zmene legislatívy ste zrealizovali ešte počas implementácie projektu?
- **Analýzy rizík**
 - Obsahuje aj návrh na elimináciu rizík?
 - Obsahuje aj iné riziká ako „ÚPVS“ a „Zákon o eGOV“ ?
- **Integrácia na centrálnych registroch a ÚPVS**
 - Na ktoré externé systémy sa projekt integruje?
 - Obsahuje DFŠ detailný návrh integrácie a integračný plán?
 - Koľko integračných stretnutí ste zrealizovali a aké máte skúsenosti z týchto stretnutí?

Ďakujeme za pozornosť!

Pavel Bojňanský

Ministerstvo financií SR

pavel.bojnansky@mfsr.sk
