

Rizká informatizácie do roku 2020 a opatrenia na ich elimináciu

Emil Fitoš
Prezident IT Asociácie Slovenska


Medzinárodný kongres ITAPA 2018
Bratislava, 22. máj 2018



„Pre-mortem“ analýza

Členovia Pracovnej skupiny GOVERNANCE
odpovedali na otázku:

Predstavte si, že je rok 2020 a informatizácia stále
nepriniesla uspokojivé výsledky.
Čo bolo príčinou tohto stavu?.

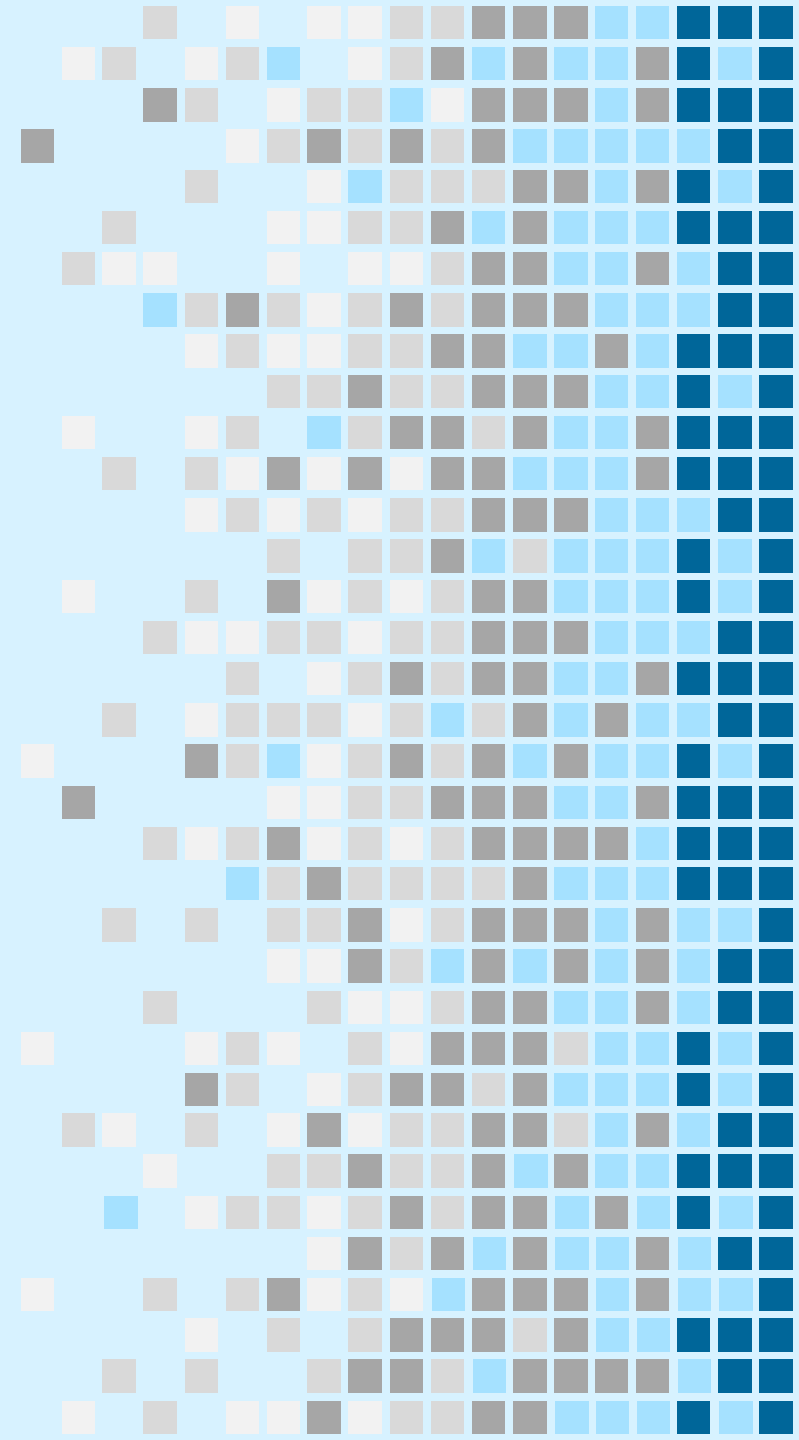


„Pre-mortem“ analýza

- Minimálna pozornosť pre rozvoj IT v samospráve **1x**
- Voľna o vplyv záujmových skupín točiacich sa okolo informatizácie **1x**
- Administratívne komplikácie – procesy EŠIF a obstarávanie **2x**
- Chýbajúce ľudské zdroje **3x**
- Nesprávna definícia cieľov **6x**
- Problémy súvisiace s koordináciou a riadením **8x**


Odporúčania

pracovnej skupiny GOVERNANCE

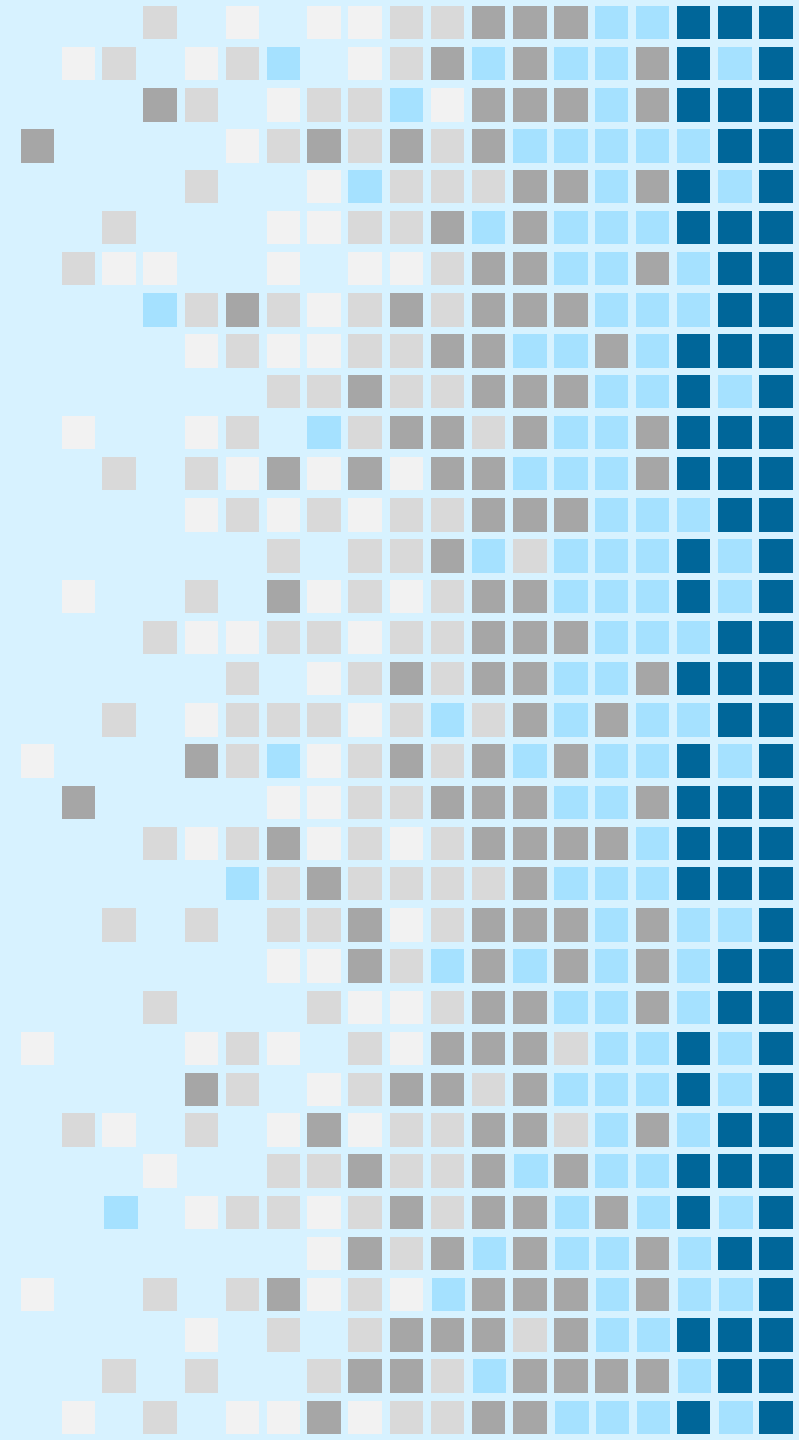

Chýbajúce ľudské zdroje

- 1. Potrebujeme kompetenčný model v oblasti IT vo verejnej správe**
 - vlastné zdroje organizácie,
 - zdieľané zdroje v rámci štátu.
 - externé zdroje.
- 2. Popis súčasného stavu ľudských IT zdrojov v štátnej správe**
- 3. Pravidlá konkurencieschopného odmeňovania pracovníkov na IT pozíciách vo verejnej správe.**



Nesprávna definícia cieľov

1. Držať sa cieľov, ktorými sú hlavne služby pre občana alebo podnikateľa
 - Služby pre konečných používateľov
 - Služby charakteru spoločných modulov a integračných rozhraní
2. Ciele by mali tvoriť zrozumiteľnú cestovnú mapu
3. Služby definujeme vždy, keď to bude možné, cez životné situácie

Problémy súvisiace s koordináciou a riadením

- 1. Vedenie na strane UPVII by malo sledovať prínosy / inovácie**
- 2. Ku každému prínosu/inovácii sa budú sledovať projektové aj neprojektové míľniky, ktoré podmieňujú jeho dosiahnutie**
 - Projektové míľniky sú napríklad reformný zámer, štúdia uskutočniteľnosti, obstaranie, zabezpečenie financovania, realizácie projektu, zabezpečenie používania
 - Neprojektové míľniky sú legislatíva, metodické opatrenia a zmeny procesov, opatrenia v oblasti ľudských zdrojov, organizačné opatrenia, popularizácia
- 3. Na strane OVM budú za plnenie zodpovedať „sponzori“, schopní garantovať plnenie projektových aj neprojektových míľnikov**
- 4. Jednoduchý pohľad na aktuálny stav programu, zdieľaný vertikálne cez UPVII, ako aj a s partnermi na OVM; musia sa sledovať paralelne aktivity aj riziká (čas, peniaze, kvalita)**

Ďakujem za Vašu pozornosť

Emil Fitoš

E: fitos@itas.sk, **W:** www.itas.sk

IT Asociácia Slovenska

